□全体工程表

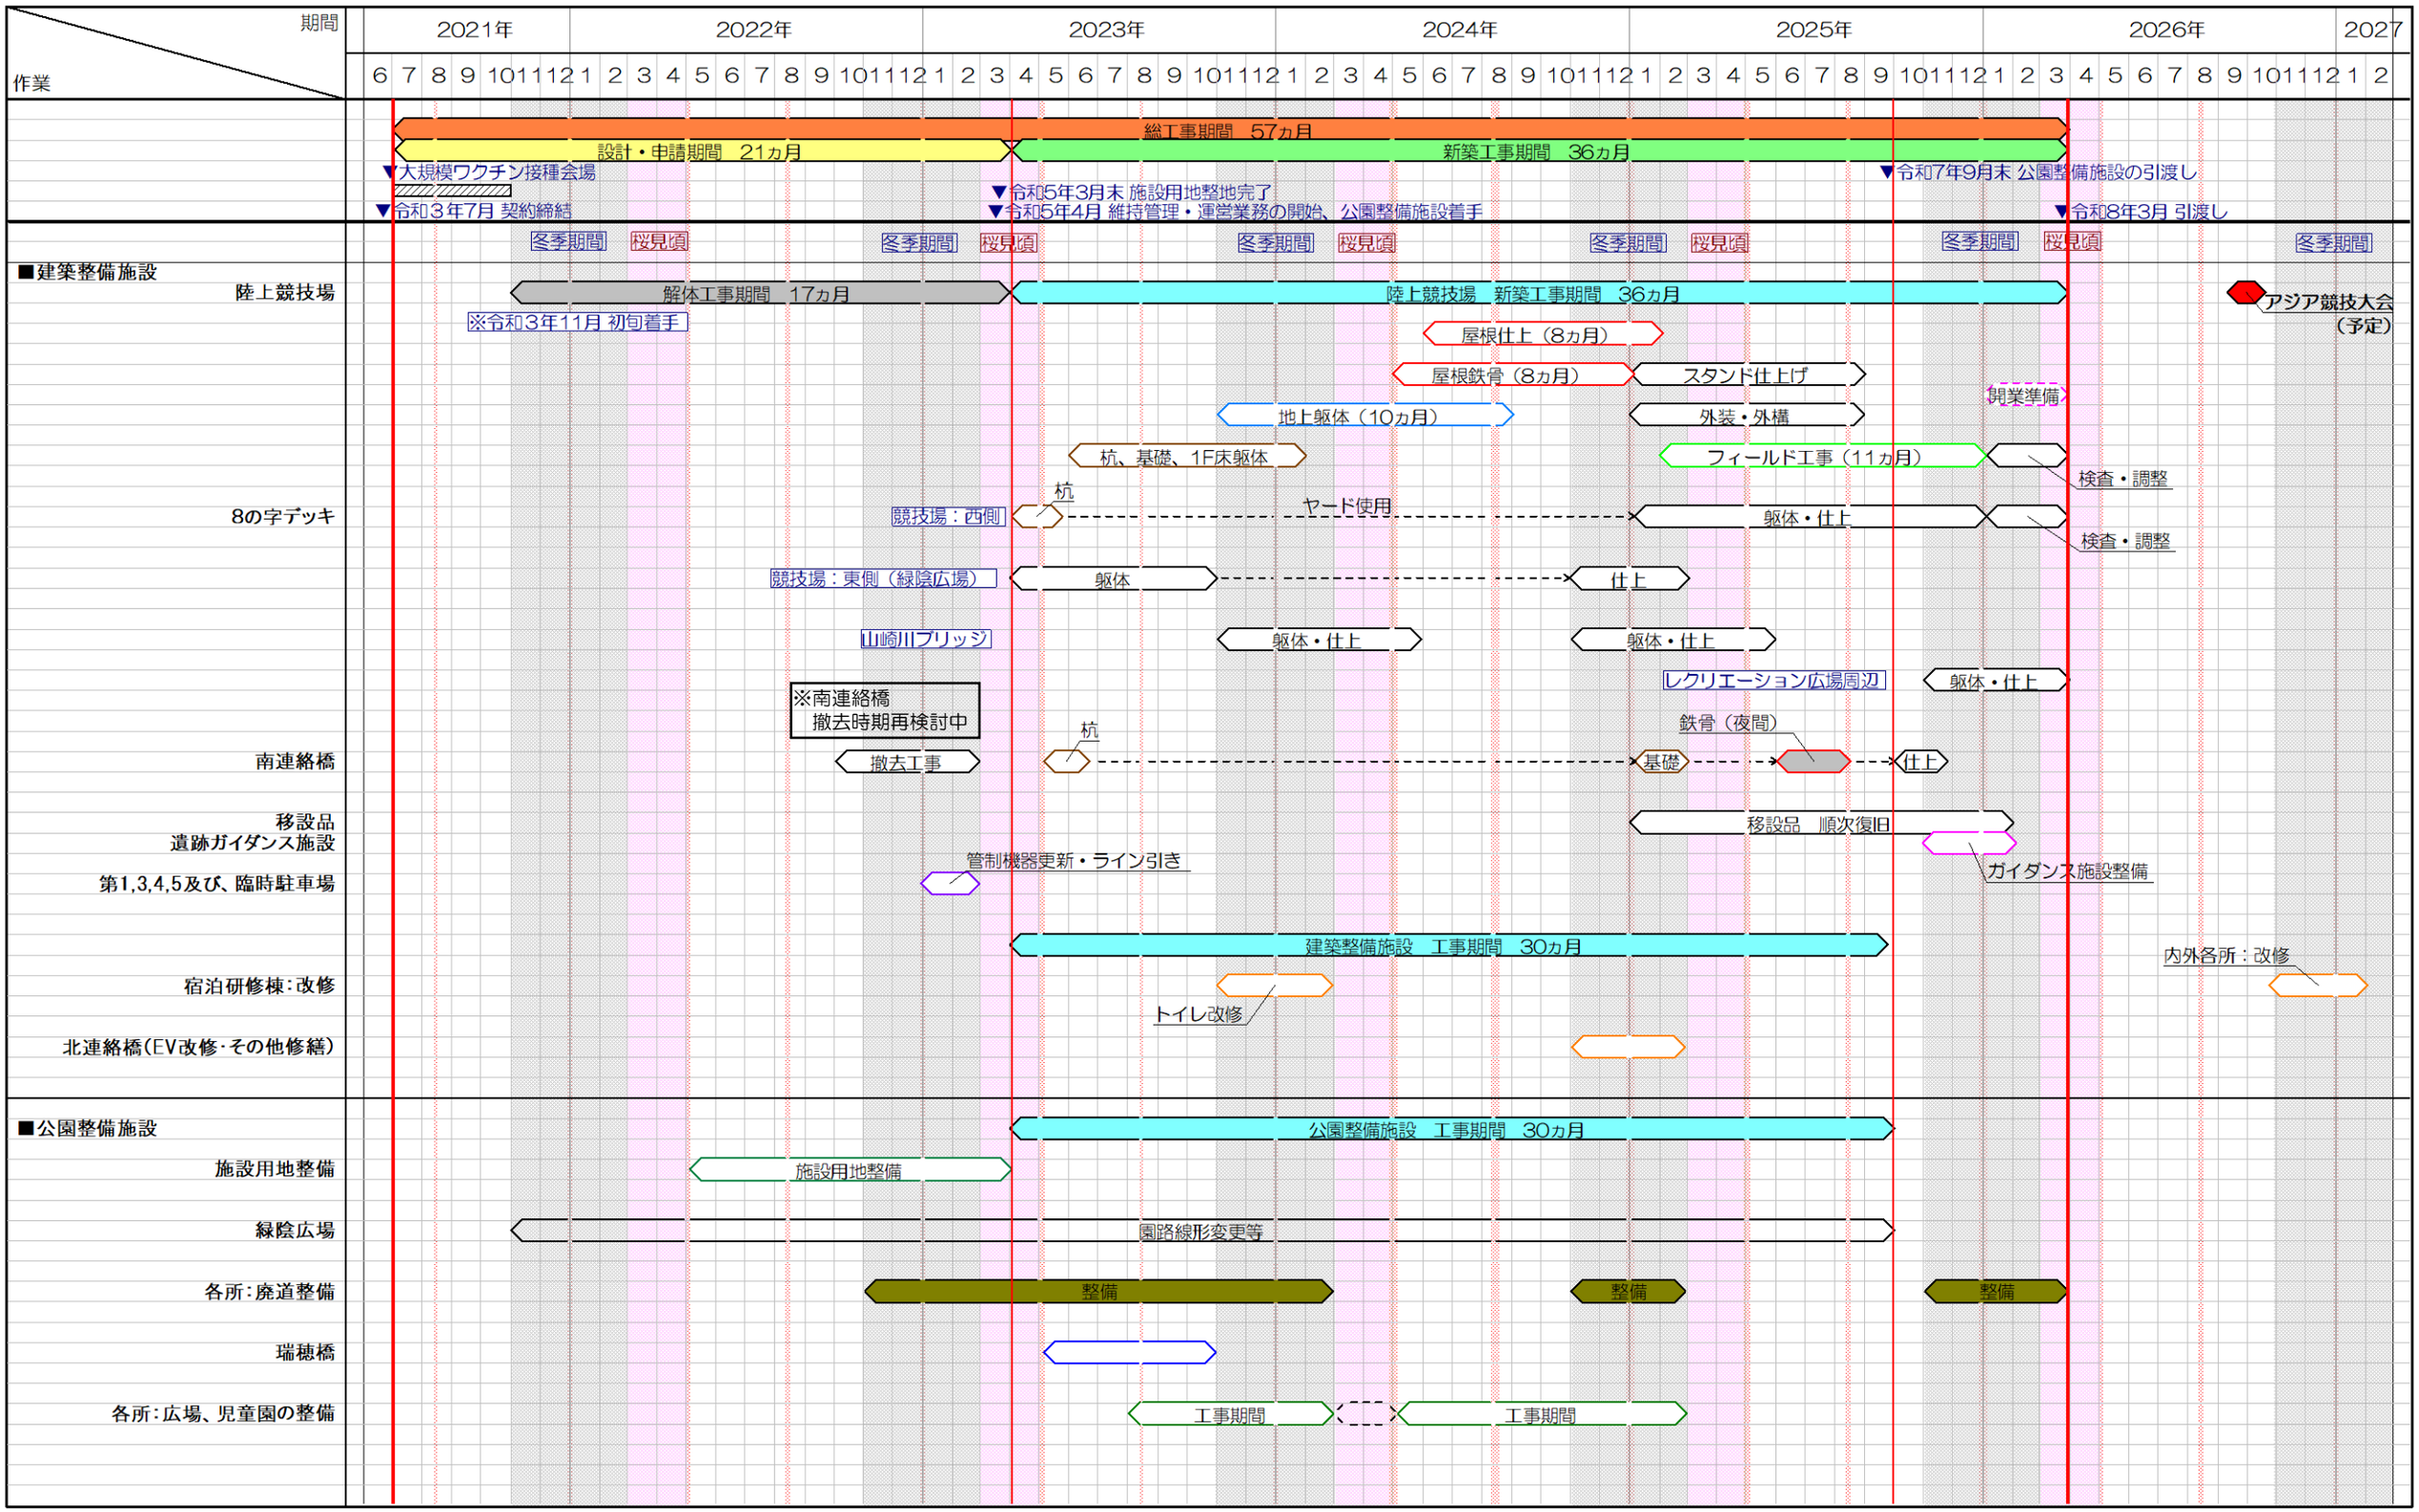
期間
作業
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
2027
総工事期間　57ヵ月
設計・申請期間　21ヵ月
新築工事期間　36ヵ月
▼大規模ワクチン接種会場
▼令和３年7月 契約締結
▼令和5年3月末 施設用地整地完了
▼令和5年4月 維持管理・運営業務の開始、公園整備施設着手
▼令和7年9月末 公園整備施設の引渡し
▼令和8年3月 引渡し
冬季期間
桜見頃
■建築整備施設
陸上競技場
解体工事期間　17ヵ月
陸上競技場　新築工事期間　36ヵ月
※令和３年11月 初旬着手
アジア競技大会
（予定）
屋根仕上（8ヵ月）
屋根鉄骨（8ヵ月）
スタンド仕上げ
開業準備
地上躯体（10ヵ月）
外装・外構
杭、基礎、1F床躯体
フィールド工事（11ヵ月）
検査・調整
8の字デッキ
杭
競技場：西側
ヤード使用
躯体・仕上
検査・調整
競技場：東側（緑陰広場）
躯体
仕上
山崎川ブリッジ
躯体・仕上
躯体・仕上
レクリエーション広場周辺
躯体・仕上
※南連絡橋
撤去時期再検討中
鉄骨（夜間）
南連絡橋
撤去工事
杭
基礎
仕上
移設品
遺跡ガイダンス施設
移設品　順次復旧
ガイダンス施設整備
第1,3,4,5及び、臨時駐車場
管制機器更新・ライン引き
建築整備施設　工事期間　30ヵ月
宿泊研修棟：改修
内外各所：改修
トイレ改修
北連絡橋（EV改修・その他修繕）
■公園整備施設
公園整備施設　工事期間　30ヵ月
施設用地整備
施設用地整備
緑陰広場
園路線形変更等
各所：廃道整備
整備
整備
整備
瑞穂橋
各所：広場、児童園の整備
工事期間
工事期間
